

# 「田原本町小学校3校統合施設基本計画」を策定

町の未来を担う子どもをはぐくむ新たな学校づくりの方向性を記載した「田原本町小学校3校統合施設基本構想」を、令和4年度に策定しました。

また令和5年度は、施設計画コンセプトとなる田原本町「みらい共育拠点」を記載した「田原本町小学校3校統合施設基本計画」により、施設整備の方針や施設の配置、平面計画（諸室配置の概略）などをとりまとめました。なお、具体的な諸室の利用方法や環境性能、構造性能などの詳細な検討は、令和6年度の設計業務において行う予定です。

教育総務課教育施設マネジメント係  
☎ 32-2906



基本計画の詳細は町ホームページをご覧ください。

## 計画の検討経過

「田原本町小学校3校統合施設基本構想」において、田原本小学校敷地に統合校を建築することとなりました。用地取得などに要する期間も不要となることで、統合が早く進み、スピード感をもって建築が進められ、既存小学校に必要な修繕費などの経費も抑制できます。

### ◆統合校舎配置の検討

北側配置と南側配置の2案で検討を行いました。

その結果、工事中の影響や仮設校舎建築の有無に係るコストを比較し、また敷地内水路に校舎を建築するリスクも鑑み、南側配置として整理しました。

### ◆屋内運動場の検討

統合校舎を南側に配置すると整理したことに伴い、既存の屋内運動場を継続して利用するのか、新たな屋内運動場を建築するのかについても検討を行いました。

既存の屋内運動場は建築年数が35年を超えており、継続して利用する場合、長寿命化改修を実施する必要があります。一方、校舎と一体もしくは近接した屋内運動場を建築する場合、建築費用が必要となります。それぞれの利便性や将来的な建替えにおける児童などへの影響、ライフサイクルコストなどを検討し、併せて、屋外運動場も整形で十分な広さが確保できることから、新校舎において一体的に建築することと整理しました。

### ◆プール設置の有無についての検討

統合校に建築あるいは民間に委託することの比較検討を行いました。それぞれにメリット・デメリットはあるものの「天候に左右されず計画的な実施ができる・専門家の指導を受けることで泳力向上に繋がる」などのメリットから、水泳授業は民間委託により実施することと判断し、統合校にはプールを設置しないことと整理しました。

### ◆工事中の学校運営への配慮

既存の屋外運動場に校舎を建築することから、工事中は屋外運動場が一部利用できなくなるため、既存プール施設を先行解体し、仮設屋外運動場を整備し、工事中でも屋外体育授業を行えるよう進めていきます。

また、現在は開放していない既存屋内運動場を休み時間にも開放し、限られたスペースの中でも大人数でできる遊びを実施するなど、児童の運動機会を確保できるよう努めていきます。

また、工事中でも給食の提供を止めることのない計画としています。

さらに、工事中の児童・教職員の安全確保が可能な動線の検討はもとより、騒音防止など授業への影響も最小限に抑える対策を講じていきます。





## 本施設 田原本町『みらい共育拠点』

### コンセプト - 郷土愛や創造力を醸成し、町の将来を担う子どもをはぐくむ -

#### 施設設備の方針

- 多様な学習形態、弾力的な集団による活動に対応できる、様々な広さやタイプの学習空間
- 主体的な学びを促進するしつらえ
- 異学年との交流を促進する空間配置
- 教員と児童が近く、安心な環境づくり
- 使いやすい運動施設と食育環境を体感できる学びの場
- 個性を発揮できる表現の場
- 郷土の文化・自然を学ぶ環境づくり
- 安心・安全と快適性に配慮した環境づくり

## 配置図・平面図

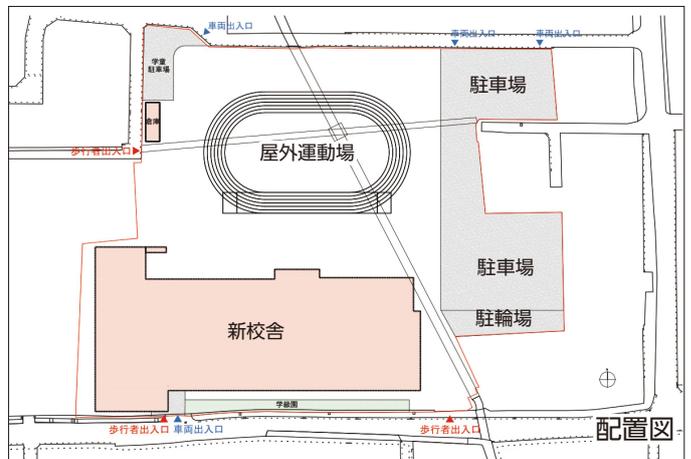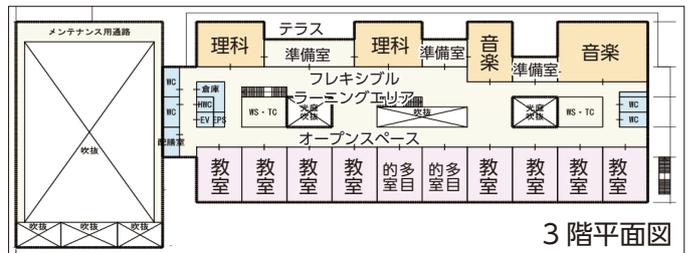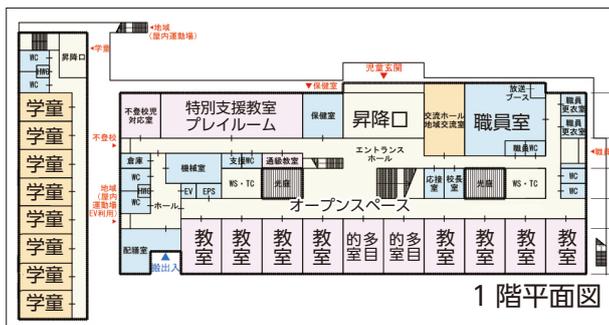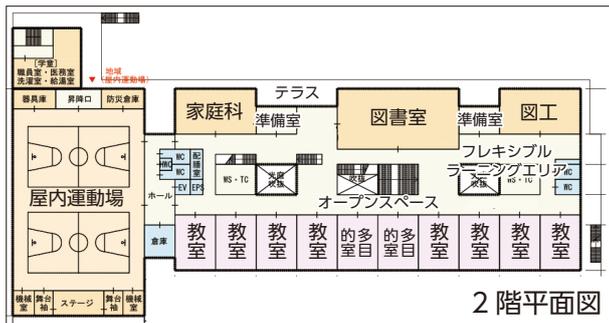

## 整備スケジュール案

	令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度				令和10年度				令和11年度				
	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	
設計業務	基本設計	10カ月																							
	開発許可申請			7カ月																					
	実施設計				8カ月																				
	建築確認申請				3カ月																				
工事監理									22カ月								11カ月								
解体工事	プール解体				2カ月																				
	仮設屋外運動場整備				2.5カ月																				
埋蔵文化財調査	I期(西側)				2カ月																				
	II期(中央・東側)				4カ月																				
統合校建設	統合校建設								22カ月																
	旧校舎解体																	8カ月							
	屋外運動場整備																		5カ月						

※今後検討が進む段階で変更する可能性があります

### ◆統合校開校時期に関するアンケートの実施

上記「整備スケジュール案」の通り、統合校舎完成時期は令和9年度末の予定です。また、令和10年度には田原本小学校の児童が新校舎に移り、旧校舎を解体し、屋外運動場の整備を行うことから、現在のところ、統合校開校は令和11年度となっております。

しかしながら、令和9年度末には統合校舎は完成していることから、屋外運動場の使用に制限があるものの

令和10年4月に3校の児童が同時に新校舎に入り、統合校開校を迎えることも検討しています。

このようなことから、開校時期についてご意見をうかがいたく、3校区在住の就学児・未就学児の保護者を対象としたアンケートを実施する予定です。ご協力よろしくお願いいたします。
