

賃金等の変動に対する

建設工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）

運用マニュアル（暫定版）

田原本町

令和8年

はじめに

本資料は、建設工事請負契約書第26条第6項のインフレスライド条項について、「賃金等の変動に対する建設工事請負契約書第26条第6項の運用について」（以下「本通達」という。）に関するスライド額の算定方法や発注者及び受注者間における協議等についての運用の考え方を整理したものである。

本資料において、出来形数量の確認や残工事量の算出等において疑義が生じた場合は、関係課と必要に応じ相談等を行い、円滑な執行に努められたい。

1. 適用対象工事

- (1) 契約書第26条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
- (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時(※)とする。

※ 賃金水準の変更がなされた時とは、国土交通省の公共工事設計労務単価の更新により、賃金水準の上昇または下降を確認しスライド適用の判断をした時点とする。なお、賃金水準が上昇した際は発注者より受注者に周知し、受注者が書面にてスライド協議の請求を行い、賃金水準が下降した際は発注者が書面にてスライド協議の請求を行うものとする。

「発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする」としているが、これは定期的にインフレスライドの該当となっているかを確認することを規定しているものであって、インフレスライドの申請時期を制限するものではない。

したがって、受注者が、工事請負契約書第26条第6項「請負代金額が著しく不適当となったとき」には、賃金水準の変更が生じていなくても、物価水準（価格水準）の上昇により請負代金額の変動額が受注者の負担である残工事費の1%を超えた場合、インフレスライドを請求することを排除しているものではない。

・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い

項目		全体スライド (契約書第26条第1項から第4項)	単品スライド (契約書第26条第5項)	インフレスライド (契約書第26条第6項)
適用対象工事		工期が12ヶ月を超える工事但し、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事（比較的大規模な長期工事）	すべての工事 （運用通達発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事）	すべての工事 但し、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事 （本通達発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事）
請負額 変更の 方法	対象	請負契約締結の日から12ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等	部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材（鋼材類、燃料油類等）	賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等
	受発注者の負担	残工事費の1.5%	対象工事費の1.0% （但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし）	残工事費の1.0% （29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。）
	再スライド	可能 （全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能）	なし （部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない）	可能 （本通達に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能）

2. 請求日及び基準日等について

請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。

- (1) 請求日：スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議（以下「スライド協議」という。）を請求した日とする。
- (2) 基準日：請求日とすることを基本とする。
また、請求があった日から起算して、14日以内に発注者と受注者とが協議して定める日とすることも可とする。
- (3) 残工期：基準日以降の工事期間とする。

● 請求日について

請求に際しては、残工事の工期が基準日（請求日とすることを基本とする。請求日から14日以内の範囲で定めることも可とする。）から2ヶ月以上必要であることに留意すること。

遡りは認めないこととする。

● 基準日について

発注者と受注者とが協議して定める基準日は、請求日を基本とするが、これにより難しい場合は、請求日から14日以内の範囲で定める。

● 残工期について

残工期については、基準日における契約工期の残工事期間を基本とするが、基準日までに変更契約を行っていない場合でも先行指示等により工期延期が明らかな場合には、その工期延期期間を考慮することができる。

3. スライド協議の請求

発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。

● スライド対象の確認

スライド判定にあたっては、設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を

確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定することを基本とする。

- スライド協議の請求について

発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面（別紙様式 1－1 又は 1－2）により行うこととする。

また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から 2 ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。

なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1 回を基本とする。（複数回のインフレスライドの申請を制限するものではない。）

- スライド額協議開始日について

発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から 7 日以内に受注者に書面（別紙様式 2）により通知する。

- 実施フローについて

別紙 1 「建設工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に伴う実施フロー」を参照すること。

4. 請負代金額の変更

(1) 賃金等の変動による請負代金額の変更額（以下「スライド額」という。）は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。

(2) 増額スライド額については、次式により行う。

$$S_{\text{増}} = [P_2 - P_1 - (P_1 \times 1/100)]$$

この式において、 $S_{\text{増}}$ 、 P_1 及び P_2 は、それぞれ次の額を表すものとする。

$S_{\text{増}}$ ：増額スライド額

P_1 ：請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

P_2 ：変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出した P_1 に相当する額

($P = \Sigma (\alpha \times Z)$ 、 α ：請負比率（当初請負代金額／当初設計額）、

Z ：発注者積算額)

(3) 減額スライド額については、次式により行う。

$$S_{\text{減}} = [P_2 - P_1 + (P_1 \times 1/100)]$$

この式において、 $S_{\text{減}}$ 、 P_1 及び P_2 は、それぞれ次の額を表すものとする。

$S_{\text{減}}$ ：減額スライド額

P_1 ：請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

P_2 ：変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出した P_1 に相当する額

($P = \Sigma (\alpha \times Z)$ 、 α ：請負比率（当初請負代金額／当初設計額）、 Z ：

発注者積算額)

(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。

● 受注者の負担割合

受注者の負担割合については、契約書第30条の「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「100分の1」としている。

● 基準日における特別調査又は見積価格採用単価について

再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費

全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。

- 複数回スライドを行う場合について

スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。

5. 出来高数量の確認

- (1) 基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとする。
- (2) 現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。
また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うものとする。
 - ・ 工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
 - ・ 基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等（架設用クレーン、仮設鋼材など）も出来形の対象とする。ただし、基準日以降の賃料等については、スライド対象とする。
 - ・ 契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
- (3) 数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
- (4) 出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
- (6) 基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量については、スライドの対象とすることができる。

- 出来形数量等の確認方法について

基準日における工事の出来形数量の確認については、本マニュアル記5.に基づき実施することを基本とする。

受注者に「工事出来高内訳書」または「実施工程表付き工事履行報告書」の提出を求め、これにより、数量総括表に対応した出来高を確認できることとする。

- 「工事出来高内訳書」による出来高の確認

「工事出来高内訳書」に記載された出来高数量により、数量総括表に対応した出来高数量を確認する。

- 「実施工程表付き工事履行報告書」による出来高の確認

次式により数量総括表に対応した出来高を算出する。(ただし、実施工程表は、基準日までに作成されたものとする。)

$$\text{出来形数量} = \text{基準日における設計数量}$$
$$\times (\text{基準日における実施済工程工期} / \text{実施工程工期})$$

本通達に基づくスライド請求を複数回行う場合、2回目以降の基準日における出来形数量の確認方法は、1回目の基準日における確認方法と原則同じ方法によることとする。

- 出来形数量等の確認時期について

発注者は、請求日から14日以内に出来高確認を行う。

6. 物価指数

発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。

- 積算に使用する単価について

変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。

- 基準日における特別調査又は見積価格採用単価について

再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。

7. 変更契約の時期

スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。

- 精算変更時で行う場合

スライド額に係る契約変更を精算変更時点で行う場合は、スライド基準日における出来形数量を確認し、残工事を受発注者間で確認すること。

- 複数年度契約の場合

工期が複数年度にわたる契約については、その最終年度を精算変更時点として契約変更を行うことができるものとするが、受注者又は発注者からの請求による協議で決定した各スライド基準日における出来形数量を都度確認し、残工事を受発注者間で確認すること。

8. 全体スライド及び単品スライド条項の併用

- (1) 契約書第26条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本運用によるスライドを請求することができる。
- (2) 本運用に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、契約書第26条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。

- 契約書第26条第6項に規定するインフレスライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっている材料を含めて、まずインフレスライド条項によるスライド額を算出することが基本となる。その上で、インフレスライド条項との重複を防止するため、インフレスライド条項の対象とした数量については、変動前の単価をインフレスライド条項の適用日の単価として単品スライド条項のスライド額を算出することとなる。
- また、インフレスライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、前者においては残工事費の1%、後者においては対象工事費の1%、それぞれで


受注者の負担が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した場合には、受注者にリスクを重複して負担させることになり、結果的にリスク負担が過大なものとなる。

- このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間においては当該期間の工事費の１％を受注者の負担とするが、インフレスライド条項と単品スライド条項が併用されている期間においては、インフレスライド条項の適用により受注者が負担する残工事費の１％をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされているとの考え方に基づき、単品スライド条項に係る１％分の負担を求めないこととした。
- さらに、単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり、インフレスライド条項と併用した場合の対象工事費はインフレスライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価となる。

９．その他留意事項等

- 建設工事請負契約書第２５条に基づく変更協議及び変更契約を同時に行う際の留意点
設計変更に伴う建設工事請負契約書第２５条に基づく変更協議及び変更契約をスライド変更と同時に行う場合に当たっては、受発注者双方の事務負担軽減の観点から変更協議書及び変更契約書については、集約して取り交わすものとする。

建設工事請負契約書第26条第6項
に伴う実施フロー

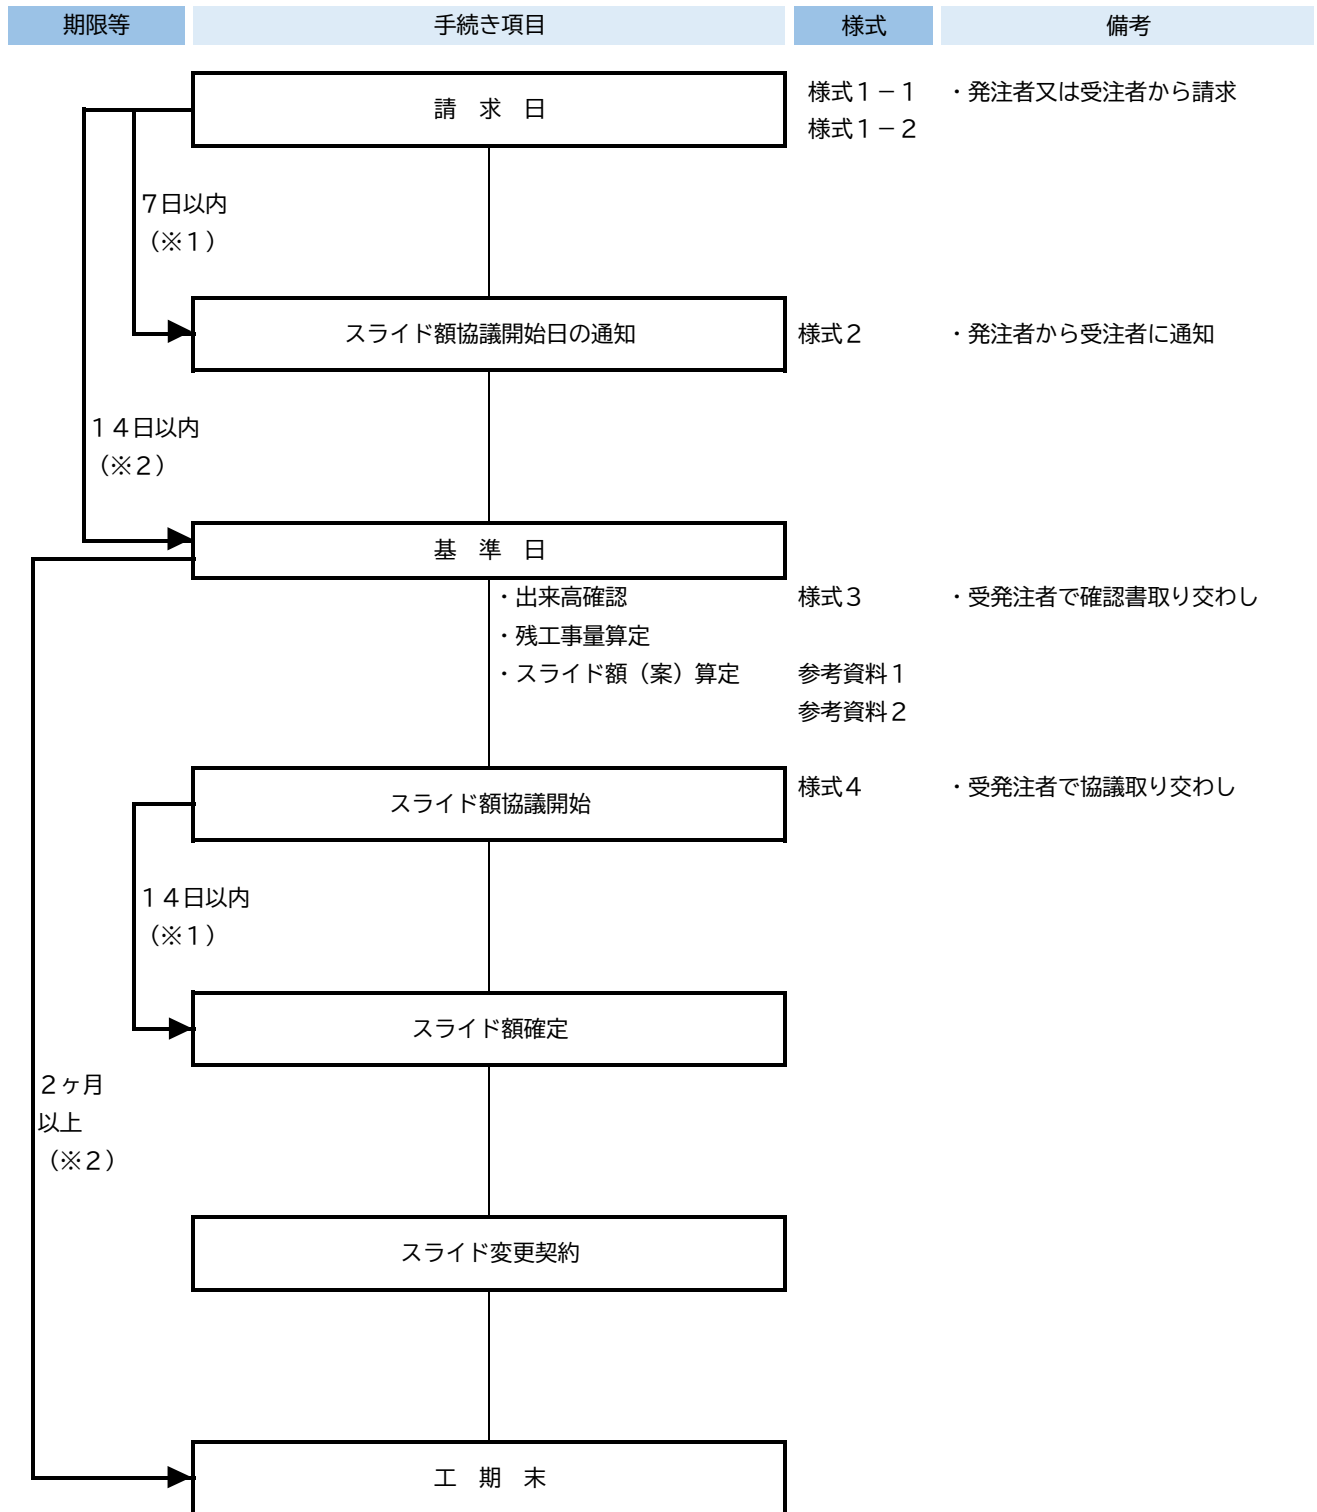

※1 契約書で規定

※2 本通達又は本マニュアルで規定

様式1-1 (インフレスライド)
[受注者からの請求]

年 月 日

田原本町長 殿

(受注者)
住 所
氏 名

建設工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について (請求)

年 月 日付けで請負契約を締結した下記工事について、労務単価等の変動により、建設工事請負契約書第26条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

1. 工 事 名

2. 工 事 場 所

3. 請 負 代 金 額 ￥

4. 工 期 自) 年 月 日
至) 年 月 日

5. 希 望 基 準 日 年 月 日

6. 変 更 請 求 概 算 額 ￥

7. 概算残工事請負代金額 ￥

概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

8. 添 付 書 類 工事出来高内訳書

※ 今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

(様式1-1) 添付資料

基準日 年 月 日

[illegible]

様式1-2 (インフレスライド)
[発注者からの請求]

田 ● 第 年 月 日

(受注者)
住 所
氏 名 様

田原本町長 ●● ●●

建設工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について（請求）

年 月 日付けで請負契約を締結した下記工事について、労務単価等の変動により、建設工事請負契約書第26条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

1. 工 事 名
2. 工 事 場 所
3. 請 負 代 金 額 ￥
4. 工 期 自) 年 月 日
至) 年 月 日
5. 希 望 基 準 日 年 月 日
6. 変 更 請 求 概 算 額 ￥
7. 概算残工事請負代金額 ￥

概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

※ 今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

様式2（インフレスライド）

田 ● 第 年 月 号 日

(受注者)
住 所
氏 名

様

田原本町長 ●● ●●

建設工事請負契約書第26条第8項に基づく協議の開始の日等について（通知）

建設工事請負契約書第26条第6項に基づき、 年 月 日付けで請求の
あった下記工事について、建設工事請負契約書第26条第6項に基づき、スライド基準日及
びスライド額協議開始日を下記のとおり定めましたので通知します。

記

1. 工 事 名

2. 工 事 場 所

3. スライド基準日 年 月 日

4. スライド額協議開始日 年 月 日

様式3（インプレスライド）

出 来 高 量 確 認 書

1. 工 事 名

2. 工 期 自) 年 月 日
至) 年 月 日

3. 基 準 日 年 月 日

4. 出 来 高 量 工事出来高内訳書のとおり

5. 出 来 高 量 確 認 者 発注者 主任監督員

6. 確 認 年 月 日 年 月 日

上記のとおり確認する。

年 月 日

(発注者)
奈良県磯城郡田原本町890-1
田原本町
町長 ●● ●●

(印)

(受注者)
住 所
氏 名

(印)

- ※ 出来高確認者は原則、主任監督員とする。
- ※ 2通作成し、発注者受注者各自1通を保有する。

(様式 3) 添付資料

確認日 年 月 日

[illegible]

※ 当該内訳書は、スライド額を算定するために必要な出来高数量（C）を確認するためのものである。
そのため確認日以降にC欄以外の数量が変更となっても再度の作成は不要である。

(参考資料 1)

ス ラ イ ド 調 書

工 事 名	
請 負 代 金 額	円 (税抜き) 円 (税込み)
設 計 書 金 額	円 (税抜き) 円 (税込み)
工 期	自 年 月 日 至 年 月 日
基 準 日	年 月 日
出 来 高 額	円 (税込み)
残 工 事 額 (P 1)	円 (税込み)
変 更 残 工 事 額 (P 2)	円 (税込み)

(参考資料2)
※増額スライド用

賃金等の変動に基づく請負代金額計算書

請負代金額	出来高額	P ₁	P ₂

スライド額 (S) = (P₂ - P₁) - P₁ × 1 / 100
= (-) - × 1 / 100
=
=

(但し、P₁ < P₂)
P₁ : 請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P₂ : 変動後 (基準日) の賃金等を基礎として算出した P₁ に相当する額

スライド額
(税込み) = × 消費税及び地方消費税率
=

(参考資料 2)
※減額スライド用

賃金等の変動に基づく請負代金額計算書

請負代金額	出来高額	P ₁	P ₂

スライド額 (S) = (P₂ - P₁) + P₁ × 1 / 100
= (-) + × 1 / 100
= +
=

(但し、P₁ > P₂)
P₁ : 請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P₂ : 変動後 (基準日) の賃金等を基礎として算出した P₁ に相当する額

スライド額
(税込み) = × 消費税及び地方消費税率
=

様式4 ※スライド適用を認める場合

田 ● 第 年 月 号 日

(受注者)

住 所
氏 名

様

田原本町長 ●● ●●

建設工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について（協議）

年 月 日付け請求のあった建設工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき下記のとおり協議します。
なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ提出願います。

記

1. 工 事 名

2. 基 準 日 年 月 日

3. ス ラ イ ド 変 更 金 額 (増) ￥

うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ￥

なお、建設工事請負契約書第26条第6項に基づく変更協議を建設工事請負契約書第25条と同時に実施する場合は、受発注者双方の事務負担を軽減する観点から協議を1回に集約してもよいものとする。

様式4 ※スライド適用を認める場合

承 諾 書

田原本町長 殿

年 月 日付けで協議のありました下記工事の建設工事
請負契約書第26条 第7項によるスライド協議変更額に異存ありません
ので、承諾します。

記

1	工 事 名											
2	スライド変更金額 (増額)			十億			百万			千		円
	うち取引に係る地 方税及び地方消費 税の額											
3	基 準 日	年 月 日										

年 月 日

受注者

住 所 :

氏 名 :

なお、建設工事請負契約書第26条第6項に基づく変更協議を建設工
事請負契約書第25条と同時に実施する場合は、受発注者双方の事務負
担を軽減する観点から協議を1回に集約してもよいものとする。

様式4 ※スライド適用を認められない場合

田 ● 第 年 月 号 日

(受注者)

住 所
氏 名

様

田原本町長 ●● ●●

建設工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について（協議）

年 月 日付け請求のあった建設工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき下記のとおり協議します。
なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ提出願います。

記

1. 工 事 名

2. スライド変更適否 スライドの適用が認められない

3. 理 由 スライド額が対象工事費の1%を超えないため

なお、建設工事請負契約書第26条第6項に基づく変更協議を建設工事請負契約書第25条と同時に実施する場合は、受発注者双方の事務負担を軽減する観点から協議を1回に集約してもよいものとする。

様式4 ※スライド適用を認められない場合

承 諾 書

田原本町長 殿

年 月 日付けで協議のありました下記工事の建設工事請負契約書第26条第7項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。

記

1. 工 事 名

2. スライド変更適否 スライドの適用が認められない

3. 理 由 スライド額が対象工事費の 1 %を超えないため

年 月 日

受注者

住 所 :

氏 名 :
